

MEDIÇÃO Nº


5

O DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, CONTR ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CEULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

	TRATA	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI	CONTRATO	ORDEM DE ÍNICIO	DATA TÉRMINO	BDI	PERÍODO DE MEDIÇÃO	VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL
ľ	IKAIA	01.631.484/0001-30	CONTRATO 46/2024 ; CONCORRÊNCIA	28/08/2024	28/09/2025	24,23%	01/06 A 02/07/2025	
4	TRATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG	Nº 004/2024 ; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024	TOTAL DIAS: 396	DIAS CORRIDOS:	276	DIAS 120 FALTANTES:	R\$ 4.171.020,32

PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG

<u> </u>	Т	-				1 EANIE	ZZ .WEDIQA		TUNA DE MINAS/M	-								
CÓDIGO					_P	REÇO TOTAL COM	MEDIÇÃO A	CUMUL	ADO ANTERIOR	MEDIÇÃ	O ATU	JAL	AC	UMUL	ADO	SALDO	DE CC	ONTRATO
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO		BDI	MEDIÇÃO	MEDI	IÇÃO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO 5	МЕ	EDICÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACL	JMULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	,	SALDO COM BDI
1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CENTROS URBANOS				R\$	27.440,96		R\$	13.720,48		R\$			R\$	13.720,48		R\$	13.720,48
1.1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01	%	1,000	R\$ 27.440,9	6	R\$27.440,96	0,500	R\$	13.720,48		R\$	-	0,50	R\$	13.720,48	0,500	R\$	13.720,48
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				R\$	795.775,92	-	R\$	177.139,93		R\$	365.511,54		R\$	542.651,47		R\$	253.124,45
2.1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	R\$ 17.392,2	0 R\$	104.353,20	1,330	R\$	23.131,63	2,77	R\$	48.176,39	4,10	R\$	71.308,02	1,90	R\$	33.045,18
2.1.1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	R\$ 8.074,9	5 R\$	48.449,70	1,330	R\$	10.739,68	2,77	R\$	22.367,61	4,10	R\$	33.107,30	1,90	R\$	15.342,41
2.1.1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	R\$ 5.993,7	7 R\$	35.962,62	1,330	R\$	7.971,71	2,77	R\$	16.602,74	4,10	R\$	24.574,46	1,90	R\$	11.388,16
2.1.1.4	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 3.303,4	4 R\$	39.641,28	2,680	R\$	8.853,22	5,54	R\$	18.301,06	8,22	R\$	27.154,28	3,78	R\$	12.487,00
2.1.1.5	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 3.395,8	8 R\$	40.750,56	2,680	R\$	9.100,96	5,54	R\$	18.813,18	8,22	R\$	27.914,13	3,78	R\$	12.836,43
2.1.1.6	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	R\$ 5.919,5	4 R\$	35.517,24	1,330	R\$	7.872,99	2,77	R\$	16.397,13	4,10	R\$	24.270,11	1,90	R\$	11.247,13
2.1.1.7	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	36,00	R\$ 4.912,1	6 R\$	176.837,76	8,040	R\$	39.493,77	16,40	R\$	80.559,42	24,44	R\$	120.053,19	11,56	R\$	56.784,57
2.1.1.8	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	36,00	R\$ 3.595,4	7 R\$	129.436,92	8,040	R\$	28.907,58	16,40	R\$	58.965,71	24,44	R\$	87.873,29	11,56	R\$	41.563,63
2.1.1.9	VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA QUINZE (15) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	MES	6,00	R\$ 15.125,7	8 R\$	90.754,68	1,330	R\$	20.117,29	2,77	' R\$	41.898,41	4,10) R\$	62.015,70	1,90	R\$	28.738,98
2.1.1.10	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	R\$ 5.829,1	6 R\$	34.974,96	1,330	R\$	7.752,78	2,77	R\$	16.146,77	4,10	R\$	23.899,56	1,90	R\$	11.075,40
2.1.1.11	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 4.924,7	5 R\$	59.097,00	2,680	R\$	13.198,33	5,54	R\$	27.283,12	8,22	R\$	40.481,45	3,78	R\$	18.615,56
3,00	SERVIÇOS INICIAIS				R\$	1.513,64	-	R\$	1.513,64		R\$			R\$	1.513,64		R\$	
3.1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,00	R\$ 378,4	1 R\$	·	4,000	R\$	1.513,64		R\$	-	4,00	R\$	1.513,64	-	R\$	-
	CANTEIRO DE OBRAS						-											
3.2.1	CANTEIRO DE OBRAS - CONTAINER				R\$	38.433,30	-	R\$	9.371,94		R\$	17.237,68		R\$	26.609,62		R\$	11.823,68

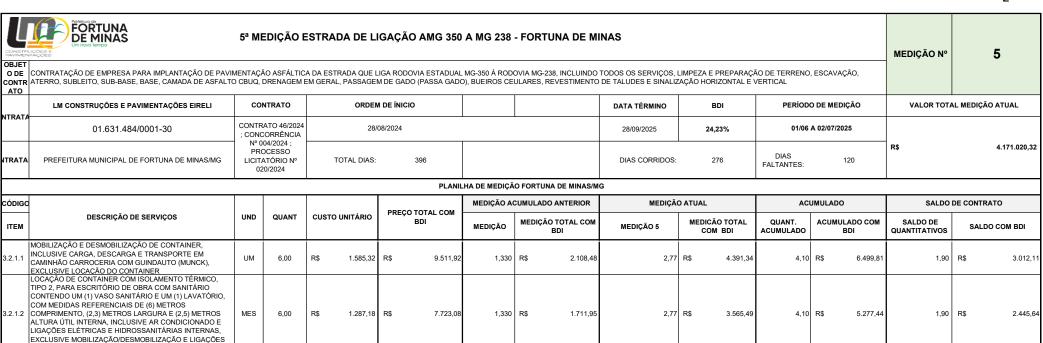

PROVISÓRIAS EXTERNAS



MEDIÇÃO Nº

5

O DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL ATO

	TRATA	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI	CONTRATO	ORDEM DE ÍNICIO	DATA TÉRMINO	BDI	PERÍODO DE MEDIÇÃO	VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL
N	IKAIA	01.631.484/0001-30	CONTRATO 46/2024 ; CONCORRÊNCIA	28/08/2024	28/09/2025	24,23%	01/06 A 02/07/2025	
NIT	TRATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG	Nº 004/2024 ; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024	TOTAL DIAS: 396	DIAS CORRIDOS:	276	DIAS 120 FALTANTES:	R\$ 4.171.020,32

PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG

						PLANIL	.HA DE MEDIÇA	O FOR	TUNA DE MINAS/M	G								
CÓDIGO					,,,,	CO TOTAL COM	MEDIÇÃO A	CUMUL	ADO ANTERIOR	MEDIÇÃ	TA O	TUAL	AC	UMULA	ADO	SALDO	DE CC	ONTRATO
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PRE	BDI	MEDIÇÃO	MEDI	IÇÃO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO 5	М	MEDICÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACU	MULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	,	SALDO COM BDI
3.2.1.3	LUCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROJUSÕRIAS EXTERNAS	MES	6,00	R\$ 866,87	R\$	5.201,22	1,330	R\$	1.152,94	2,77	7 R\$	2.401,23	4,10) R\$	3.554,17	1,90	R\$	1.647,05
3.2.1.4	CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	MES	6,00	R\$ 1.250,99	R\$	7.505,94	1,330	R\$	1.663,82	2,77	7 R\$	3.465,24	4,10	R\$	5.129,06	1,90	R\$	2.376,88
3.2.1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2.3) METROS LARGURA E (2.5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MES	6,00	R\$ 1.232,63	R\$	7.395,78	1,330	R\$	1.639,40	2,77	7 R\$	3.414,39	4,10) R\$	5.053,78	1,90	R\$	2.342,00
3.2.1.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)	UN	1,00	R\$ 352,70	R\$	352,70	1,000	R\$	352,70		R\$	-	1,00	R\$	352,70	-	R\$	-
3.2.1.7	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA	UN	1,00	R\$ 368,23	R\$	368,23	1,000	R\$	368,23		R\$	-	1,00	R\$	368,23	-	R\$	-
3.2.1.8	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 374,43	R\$	374,43	1,000	R\$	374,43		R\$	-	1,00	R\$	374,43	-	R\$	-
3.3.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS				R\$	115.527,06	-	R\$	25.608,50		R\$	53.334,99		R\$	78.943,49		R\$	36.583,57
3.3.1.1	TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	MES	6,00	R\$ 19.254,51	R\$	115.527,06	1,330	R\$	25.608,50	2,77	7 R\$	53.334,99	4,10	R\$	78.943,49	1,90	R\$	36.583,57
4,00	INFRAESTRUTURA						-											
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-											
4.1.1 4.1.1.1	SUPRESSÃO VEGETAL DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	70.494,72	R\$ 0,58	R\$ R\$	86.754,59 40.886,94	70.494,720	R\$	86.754,59 40.886,94	-	R\$		70.494,72	R\$ 2 R\$	86.754,59 40.886,94	-	R\$	- -
4.1.1.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	60,00	R\$ 66,05	R\$	3.963,00	60,000	R\$	3.963,00		R\$	-	60,00	R\$	3.963,00	-	R\$	-
4.1.1.3	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	35,00	R\$ 117,67	R\$	4.118,45	35,000	R\$	4.118,45		R\$	-	35,00	R\$	4.118,45	-	R\$	-
	AF_07/2020	M3/KM	14.258,94	R\$ 2,65	<u> </u>	37.786,20	14.258,944		37.786,20	-	R\$		14.258,94		37.786,20	-	R\$	
4.1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA				R\$	16.806,96	-	R\$	9.897,53		R\$	1.758,51		R\$	11.656,04		R\$	5.150,92
4.1.2.1	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	50,00	R\$ 39,65	R\$	1.982,50	35,000	R\$	1.387,75	5,00	R\$	198,25	40,00	R\$	1.586,00	10,00	R\$	396,50
4.1.2.2	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM	М	5.000,00	R\$ 0,19	R\$	950,00	3.500,000	R\$	665,00	500,00	R\$	95,00	4.000,00	R\$	760,00	1.000,00	R\$	190,00

FISCALIZAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS

TATIANE DE OLIVEIRA LOPES



MEDIÇÃO Nº

O DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL ATO

	TRATA	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI	CONTRATO	ORDEM DE ÍNICIO	DATA TÉRMINO	BDI	PERÍODO DE MEDIÇÃO	VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL
N	IKAIA	01.631.484/0001-30	CONTRATO 46/2024 ; CONCORRÊNCIA	28/08/2024	28/09/2025	24,23%	01/06 A 02/07/2025	
1	TRATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG	Nº 004/2024 ; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024	TOTAL DIAS: 396	DIAS CORRIDOS:	276	DIAS 120 FALTANTES:	R\$ 4.171.020,32

PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG

					PLANI	HA DE MEDIÇA	O FORTUNA DE MINAS/N	IG					
CÓDIG	o				DDECO TOTAL COM	MEDIÇÃO A	CUMULADO ANTERIOR	MEDIÇÃ	O ATUAL	AC	UMULADO	SALDO	DE CONTRATO
ITEN	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO 5	MEDICÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACUMULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	SALDO COM BDI
4.1.2.3	SINALIZAÇAO - CONE EM PVC H= 75 CM	UN	200,00	R\$ 36,69	R\$ 7.338,00	130,000	R\$ 4.769,70	10,00	R\$ 366,90	140,00	R\$ 5.136,60	60,00	R\$ 2.201,40
4.1.2.4	SINALIZAÇAO - SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	UN	15,00	R\$ 114,70	R\$ 1.720,50	3,000	R\$ 344,10	3,00	R\$ 344,10	6,00	R\$ 688,20	9,00	R\$ 1.032,30
4.1.2.5	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	М	200,00	R\$ 13,50	R\$ 2.700,00	130,000	R\$ 1.755,00	25,00	R\$ 337,50	155,00	R\$ 2.092,50	45,00	R\$ 607,50
4.1.2.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,0 MM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA.	UN.DIA	132,00	R\$ 3,47	R\$ 458,04	62,000	R\$ 215,14	24,00	R\$ 83,28	86,00	R\$ 298,42	46,00	R\$ 159,62



MEDIÇÃO Nº

5

ODE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, CONTR ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CEULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL ATO

	ITRATA	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI	CONTRATO	ORDEM DE ÍNICIO	DATA TÉRMINO	BDI	PERÍODO DE MEDIÇÃO	VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL
ľ	IIKAIA	01.631.484/0001-30	CONTRATO 46/2024 ; CONCORRÊNCIA	28/08/2024	28/09/2025	24,23%	01/06 A 02/07/2025	
V	TRATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG	Nº 004/2024 ; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024	TOTAL DIAS: 396	DIAS CORRIDOS:	276	DIAS 120 FALTANTES:	R\$ 4.171.020,32

PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG

						PLANIL	HA DE MEDIÇA	OFORIC	UNA DE MINAS/M	G						
CÓDIGO						O TOTAL COM	MEDIÇÃO A	CUMULAI	DO ANTERIOR	MEDIÇÃ	O ATUAL	AC	UMULADO	SALDO	DE COI	NTRATO
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇ	BDI	MEDIÇÃO	MEDIÇ	ÃO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO 5	MEDICÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACUMULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	S	ALDO COM BDI
4.1.2.7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	132,00	R\$ 3,62	R\$	477,84	62,000	R\$	224,44	24,00	R\$ 86,88	86,00	R\$ 311,32	46,00	R\$	166,52
4.1.2.8	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R2 LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA.	UN.DIA	264,00	R\$ 1,56	R\$	411,84	120,000	R\$	187,20	60,00	R\$ 93,60	180,00	R\$ 280,80	84,00	R\$	131,04
4.1.2.9	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALIETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA.	UN.DIA	264,00	R\$ 1,83	R\$	483,12	120,000	R\$	219,60	60,00	R\$ 109,80	180,00	R\$ 329,40	84,00	R\$	153,72
4 4 0 40	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA.	UN.DIA	264,00	R\$ 1,08	R\$	285,12	120,000	R\$	129,60	40,00	R\$ 43,20	160,00	R\$ 172,80	104,00	R\$	112,32
4.2	TERRAPLENAGEM						-									
4.2.1	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA				R\$	3.420.598,13	-	R\$	2.037.883,44		R\$ 519.546,94		R\$ 2.557.430,38		R\$	863.167,75
4.2.2.1	REMOÇÃO DE MATA-BURRO	U	1,00	R\$ 339,30	R\$	339,30	-	R\$	-	1,00	R\$ 339,30	1,00	R\$ 339,30	-	R\$	-
4.2.3.2	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	ML	2.005,00	R\$ 9,90	R\$	19.849,50	1.267,493	R\$	12.548,18	737,48	R\$ 7.301,05	2.004,97	R\$ 19.849,23	0,03	R\$	0,27
4.2.4.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M3	3.902,90	R\$ 9,24	R\$	36.062,80	3.902,900	R\$	36.062,80		R\$ -	3.902,90	R\$ 36.062,80	-	R\$	-
4.2.5.4	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	М3	5.854,35	R\$ 123,74	R\$	724.417,27	5.854,350	R\$	724.417,27		R\$ -	5.854,35	R\$ 724.417,27	-	R\$	-
4.2.6.5	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO TIPO CAIXA DE TELA GALVAZINADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E A CARGA DA PEDRA, EXCLUI O TRANSPORTE DA PEDRA DE MÃO).	М3	100,00	R\$ 842,78	R\$	84.278,00	100,000	R\$	84.278,00	-	R\$ -	100,00	R\$ 84.278,00	-	R\$	-
4.2.7.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 Mª, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (SOLO MOLE DMT ATE 5,0 KM)	мзхкм	3.902,90	R\$ 2,82	R\$	11.006,18	3.902,900	R\$	11.006,18		R\$ -	3.902,90	R\$ 11.006,18	-	R\$	-
4.2.8.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	мзхкм	130.995,70	R\$ 1,59	R\$	208.283,16	130.995,700	R\$	208.283,16	-	R\$ -	130.995,70	R\$ 208.283,16	-	R\$	-
4.2.9.8	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA (SOLO MOLE)	М3	3.902,90	R\$ 2,26	R\$	8.820,55	3.902,900	R\$	8.820,55		R\$ -	3.902,90	R\$ 8.820,55	-	R\$	-



MEDIÇÃO Nº

5

O DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL ATO

		LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI	CONTRATO	ORDEM DE ÍNICIO		DATA TÉRMINO	BDI	PERÍODO DE	E MEDIÇÃO	VALOR TOTA	L MEDIÇÃO ATUAL
ľ	ITRATA	01.631.484/0001-30	CONTRATO 46/2024 ; CONCORRÊNCIA	28/08/2024		28/09/2025	24,23%	01/06 A 02	2/07/2025		
4	TRATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG	Nº 004/2024 ; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024	TOTAL DIAS: 396		DIAS CORRIDOS:	276	DIAS FALTANTES:	120	R\$	4.171.020,32

PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG

					PLANI	LHA DE MEDIÇA	O FORTUNA DE MINAS/M	G					
CÓD	GO				PREÇO TOTAL COM	MEDIÇÃO A	CUMULADO ANTERIOR	MEDIÇÃ	O ATUAL	AC	UMULADO	SALDO	DE CONTRATO
ITE	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO 5	MEDICÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACUMULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	SALDO COM BDI
4.2.9	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1º CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M² / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÔES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	94.229,48	R\$ 16,26	R\$ 1.532.171,34	42.794,660	R\$ 695.841,17	16.804,06	R\$ 273.234,03	59.598,72	R\$ 969.075,20	34.630,76	R\$ 563.096,15
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 10 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	М3	70.328,34	R\$ 8,80	R\$ 618.889,39	29.162,060	R\$ 256.626,13	27.121,88	R\$ 238.672,56	56.283,94	R\$ 495.298,69	14.044,40	R\$ 123.590,70
	111 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M2	4.300,90	R\$ 12,93	R\$ 55.610,64	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -	4.300,90	R\$ 55.610,64
4.2.9	REGULARIZAÇÃO DE BOTA FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO.	M2	51.000,00	R\$ 2,37	R\$ 120.870,00	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -	51.000,00	R\$ 120.870,00



MEDIÇÃO Nº

5

O DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL ATO

	TRATA	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI	CONTRATO	ORDEM DE ÍNICIO		DATA TÉRMINO	BDI	PERÍODO	DE MEDIÇÃO	VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATU	IAL
ľ	IKAIA	01.631.484/0001-30	CONTRATO 46/2024 ; CONCORRÊNCIA	28/08/2024		28/09/2025	24,23%	01/06 A	02/07/2025		
۸.	TRATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG	Nº 004/2024 ; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024	TOTAL DIAS: 396		DIAS CORRIDOS:	276	DIAS FALTANTES:	120	R\$ 4.17	71.020,32

PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG

						1 EANIE	IIA DE MEDIÇA	0.0	UNA DE MINAS/MI									
CÓDIGO					, DDEC	O TOTAL COM	MEDIÇÃO A	CUMULA	ADO ANTERIOR	MEDIÇÃ	O ATU	AL	AC	UMUL	ADO	SALDO	DE CC	NTRATO
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇ	BDI	MEDIÇÃO	MEDIÇ	ÇÃO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO 5		DICÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACL	IMULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	8	SALDO COM BDI
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				<u> </u>		-											
4.3.1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$	6.240.524,36	-	R\$	365.379,05		R\$	3.050.227,33		R\$	3.415.606,38		R\$	2.824.917,98
4.3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	41.049,00	R\$ 2,94	R\$	120.684,06	6.732,000	R\$	19.792,08	23.686,15	R\$	69.637,29	30.418,15	R\$	89.429,37	10.630,85	R\$	31.254,69
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	М3	10.199,71	R\$ 193,12	R\$	1.969.767,42	1.082,400	R\$	209.033,09	2.850,48	R\$	550.484,12	3.932,88	R\$	759.517,21	6.266,83	R\$	1.210.250,21
4.3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	403.908,40	R\$ 1,18	R\$	476.611,91	98.714,880	R\$	116.483,56	259.963,50	R\$	306.756,93	358.678,38	R\$	423.240,49	45.230,01	R\$	53.371,42
4.3.1.4	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	37.480,93	R\$ 4,22	R\$	158.169,52	4.756,000	R\$	20.070,32	18.492,00	R\$	78.036,24	23.248,00	R\$	98.106,56	14.232,93	R\$	60.062,96
4.3.1.5	PINTURA - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	37.480,93	R\$ 2,73	R\$	102.322,94	-	R\$	-	18.492,00	R\$	50.483,16	18.492,00	R\$	50.483,16	18.988,93	R\$	51.839,78
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	МЗ	1.874,05	R\$ 1.672,50	R\$	3.134.342,77	-	R\$	-	1.096,21	R\$	1.833.413,50	1.096,21	R\$	1.833.413,50	777,84	R\$	1.300.929,27
4.3.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	мзхкм	56.221,40	R\$ 2,91	R\$	163.604,26	-	R\$	-	32.886,34	R\$	95.699,25	32.886,34	R\$	95.699,25	23.335,05	R\$	67.905,01
4.3.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	мзхкм	93.702,33	R\$ 1,14	R\$	106.820,65	-	R\$	-	54.810,57	R\$	62.484,05	54.810,57	R\$	62.484,05	38.891,76	R\$	44.336,60
4.3.1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	2.248,86	R\$ 2,18	R\$	4.902,51	-	R\$	-	886,51	R\$	1.932,58	886,51	R\$	1.932,58	1.362,35	R\$	2.969,92
4.3.1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	3.748,09	R\$ 0,88	R\$	3.298,32	-	R\$	-	1.477,51	R\$	1.300,21	1.477,51	R\$	1.300,21	2.270,58	R\$	1.998,11
	DRENAGEM						-											
4.4.1	DIVERSOS				R\$	1.264.041,56	-	R\$	95.927,64	•	R\$	926,44		R\$	96.854,09		R\$	1.167.187,47
4.4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	М3	1.596,09	R\$ 9,90	R\$	15.801,29	381,170	R\$	3.773,58	93,58	R\$	926,44	474,75	R\$	4.700,03	1.121,34	R\$	11.101,27
4.4.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	157,95	R\$ 4,63	R\$	731,31	157,950	R\$	731,31		R\$	-	157,95	R\$	731,31	-	R\$	_
4.4.1.3	FORMA PARA BERÇO, EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	106,92	R\$ 24,85	R\$	2.656,96	106,920	R\$	2.656,96		R\$	-	106,92	R\$	2.656,96	-	R\$	<u> </u>



MEDIÇÃO Nº

0

O DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL ATO

		LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI	CONTRATO	ORDEM DE ÍNICIO			DATA TÉRMINO	BDI	PERÍODO DE MEDIÇÃO		VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL		
ľ	ITRATA	01.631.484/0001-30	CONTRATO 46/2024 ; CONCORRÊNCIA	28/08/2024	28/09/2025	24,23%	01/06 A 02	2/07/2025					
4	TRATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG	N° 004/2024 ; PROCESSO LICITATÓRIO N°	PROCESSO	TOTAL DIAS: 396			DIAS CORRIDOS:	276	DIAS FALTANTES:	120	R\$	4.171.020,32

PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG

PLANILHA DE MEDIÇAO FORTUNA DE MINAS/MIG													
CÓDIO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS			CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL COM	MEDIÇÃO ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃ	O ATUAL	AC	UMULADO	SALDO DE CONTRATO	
ITEN		UND	QUANT		BDI BDI	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO 5	MEDICÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACUMULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	SALDO COM BDI
4.4.1.4	CONCRETO PARA BERÇO TUBULAR, USINADO, FCK ≥ 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO	М3	52,25	R\$ 510,33	R\$ 26.664,74	52,250	R\$ 26.664,74		R\$ -	52,25	R\$ 26.664,74	-	R\$ -
4.4.1.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	М	121,50	R\$ 469,11	R\$ 56.996,87	121,500	R\$ 56.996,87		R\$ -	121,50	R\$ 56.996,87	-	R\$ -
4.4.1.6	BOCA DE BSTC D=0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	UN	12,00	R\$ 1.142,77	R\$ 13.713,24	2,000	R\$ 2.285,54		R\$ -	2,00	R\$ 2.285,54	10,00	R\$ 11.427,70
4.4.1.	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.	UN	4,00	R\$ 3.269,82	R\$ 13.079,28	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -	4,00	R\$ 13.079,28
4.4.1.8	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS.	UN	1,00	R\$ 6.128,11	R\$ 6.128,11	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 6.128,11



MEDIÇÃO Nº


5

O DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, CONTR ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CEULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

	NTRATA	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI	CONTRATO	ORDEM DE ÍNICIO	DATA TÉRMINO	BDI	PERÍODO DE MEDIÇÃO	VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL		
ľ	NIKAIA	01.631.484/0001-30 CONTRATO ; CONCORI	CONTRATO 46/2024 ; CONCORRÊNCIA	28/08/2024	28/09/2025	24,23%	01/06 A 02/07/2025			
ı	ITRATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG	CONTRATO 46/202 ; CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 ; PROCESSO	TOTAL DIAS: 396	DIAS CORRIDOS:	276	DIAS 120 FALTANTES:	R\$ 4.171.020,32		

PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG

	PLANILIA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINASIMO														
CÓDIGO					PRECO TOTAL COM	MEDIÇÃO A	CUMULADO ANTERIOR	MEDIO	MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO DE CONTRATO		
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PRE	BDI	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO 5	MEDICÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACUMULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	s	ALDO COM BDI
	BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 3,00X3,00 COM ADUELAS PRÉ-MOLDADAS - AQUISIÇÃO COMERCIAL - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	М	14,00	R\$ 20.519,66	R\$	287.275,24	-	R\$		R\$ -		R\$ -	14,00	R\$	287.275,24
4.4.1.10	BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	R\$ 33.319,74	R\$	66.639,48	-	R\$		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$	66.639,48
4.4.1.11	PASSA-GADO - COM ADUELAS 1,50X2,00 CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTACÃO)	М	28,00	R\$ 10.314,97	R\$	288.819,16	-	R\$		R\$ -		R\$ -	28,00	R\$	288.819,16
4.4.1.12	BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BSCC (1,50 X 2,00)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	М	4,00	R\$ 3.732,47	' R\$	14.929,88	-	R\$		R\$ -		R\$ -	4,00	R\$	14.929,88
4.4.1.13	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	МЗ	200,12	R\$ 19,56	R\$	3.914,35	144,102	R\$ 2.818,6	4 -	R\$ -	144,10	R\$ 2.818,64	56,02	R\$	1.095,70
4.4.1.14	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	90,00	R\$ 209,27	R\$	18.834,30	-	R\$		R\$ -		R\$ -	90,00	R\$	18.834,30
4.4.1.15	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.	М	560,00	R\$ 84,86	R\$	47.521,60	-	R\$.		R\$ -		R\$ -	560,00	R\$	47.521,60
4.4.1.16	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.	М	707,35	R\$ 84,86	R\$	60.025,72	-	R\$		R\$ -		R\$ -	707,35	R\$	60.025,72
4.4.1.17	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SARJETA DE CORTE (STC-02)	М	4.889,59	R\$ 62,30	R\$	304.621,46	i	R\$ -		R\$ -		R\$ -	4.889,59	R\$	304.621,46
4.4.1.18	ENTRADA DÀGUA PARA DECIDA TIPO EDA-01	UN	34,00	R\$ 50,41	R\$	1.713,94	•	R\$		R\$ -		R\$ -	34,00	R\$	1.713,94
4.4.1.19	ENTRADA DÀGUA PARA DECIDA TIPO EDA-02	UN	2,00	R\$ 62,68	R\$	125,36	-	R\$		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$	125,36
4.4.1.20	DESCIDA DÀGUA EM DEGRAUS PARA ATERRO TIPO DAD-06	М	47,50	R\$ 680,81	R\$	32.338,48		R\$		R\$ -		R\$ -	47,50	R\$	32.338,48
	DESCIDA DÀGUA TIPO RÁPIDA DAR-02	М	12,00	R\$ 125,90	R\$	1.510,80	-	R\$		R\$ -		R\$ -	12,00	R\$	1.510,80
4.4.2	OBRAS COMPLEMENTARES				R\$	485.595,35		R\$ 63.226,0	1	R\$ 162.476,89		R\$ 225.702,90		R\$	259.892,45
4.4.2.1	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM REGULARIZAÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE	М	759,00	R\$ 58,31	R\$	44.257,29	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -	759,00	R\$	44.257,29
4.4.2.2	REGULARIZAÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE GRAMA PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM DESNÍVEI	M2	3.752,00	R\$ 5,10	R\$	19.135,20	-	R\$.		R\$ -		R\$ -	3.752,00	R\$	19.135,20

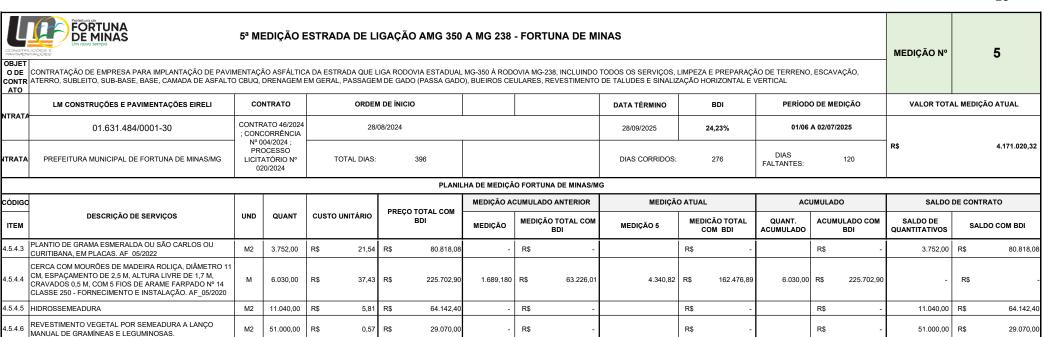

R\$

R\$

R\$

3,00 R\$

19.913,16

MATA-BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE

DE TODOS OS MATERIAIS)

3,00

R\$

6.637,72

19.913,16



MEDIÇÃO Nº

5

O DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA RODOVIA ESTADUAL MG-350 À RODOVIA MG-238, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO, ESCAVAÇÃO, CONTR ATERRO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, CAMADA DE ASFALTO CBUQ, DRENAGEM EM GERAL, PASSAGEM DE GADO (PASSA GADO), BUEIROS CEULARES, REVESTIMENTO DE TALUDES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL ATO

	TRATA	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI	CONTRATO	ORDEM DE ÍNICIO		DATA TÉRMINO	BDI	PERÍODO DE MEDIÇÃO		VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL	
IN	IKAIA	01.631.484/0001-30	CONTRATO 46/2024 ; CONCORRÊNCIA	28/08/2024	28/09/2025	24,23%	01/06 A	02/07/2025			
١	TRATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG	№ 004/2024 ; PROCESSO LICITATÓRIO № 020/2024	TOTAL DIAS: 396		DIAS CORRIDOS:	276	DIAS FALTANTES:	120	R\$	4.171.020,32

PLANILHA DE MEDIÇÃO FORTUNA DE MINAS/MG

	PLANILHA DE MEDIÇAO FORTUNA DE MINAS/MG												
CÓDIG	1				PRECO TOTAL COM	MEDIÇÃO A	CUMULADO ANTERIOR	MEDIÇÃ	O ATUAL	AC	UMULADO	SALDO DE CONTRATO	
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS M	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO 5	MEDICÃO TOTAL COM BDI	QUANT. ACUMULADO	ACUMULADO COM BDI	SALDO DE QUANTITATIVOS	SALDO COM BDI
4.5.4.8	PORTEIRA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, ALTURA 155CM, CONFORME PROJETO TIPO DE OBRAS COMPLEMENTARES (FOLHA 39), EXCLUSIVE DOBRADIÇAS, FECHOS E INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)	UN	2,00	R\$ 1.278,16	R\$ 2.556,3:	_	R\$ -		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 2.556,32
4.5	MODALIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA					-							
4.5.1	MODALIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA				R\$ 21.962,5	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 21.962,54
4.5.1.1	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO	М3	20,00	R\$ 25,10	R\$ 502,0	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ 502,00
4.5.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	200,00	R\$ 3,27	R\$ 654,0	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -	200,00	R\$ 654,00
4.5.1.3	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	M2	200,00	R\$ 76,20	R\$ 15.240,0	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -	200,00	R\$ 15.240,00
4.5.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	23,00	R\$ 82,31	R\$ 1.893,1	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -	23,00	R\$ 1.893,13
4.5.1.5	PISO DE LADRILHO HIDRAULICO - 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA	M2	23,00	R\$ 98,35	R\$ 2.262,0	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -	23,00	R\$ 2.262,05
4.5.1.6	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UN	4,00	R\$ 324,24	R\$ 1.296,9	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -	4,00	R\$ 1.296,96
4.5.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	мзхкм	40,00	R\$ 2,86	R\$ 114,4	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00	R\$ 114,40
4.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					-							
4.6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL				R\$ 92.844,1	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 92.844,14
4.6.1.1	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	10,56	R\$ 1.093,53	R\$ 11.547,6	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,56	R\$ 11.547,68
4.6.1.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	2,32	R\$ 978,89	R\$ 2.271,0	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -	2,32	R\$ 2.271,02
4.6.1.3	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	2,00	R\$ 939,47	R\$ 1.878,9	1	R\$ -		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 1.878,94

5

4.171.020,32

20.622,00

56.524,50

106.898,17

82.844,37

24.053,80

184.278,00

116.664,00


26.994,00

40.620,00

5.841.556,93

4.171.020,32

12.899.000,00

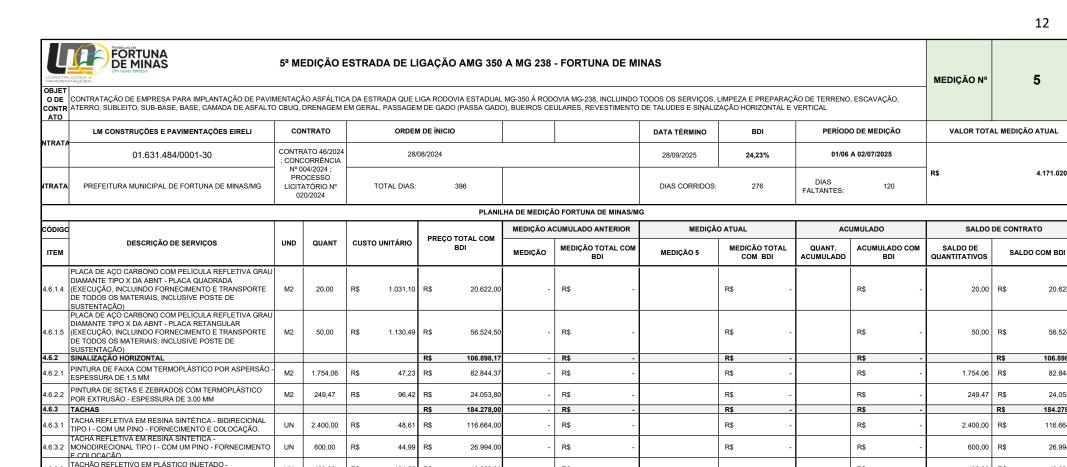

40.620,00

12.899.000,00 R\$

R\$12.899.000.00

400,00 R\$

R\$

7.057.443,08

VALOR CONTRATO

R\$

4.171.020,32

BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

VALOR TOTAL MEDIÇÃO ATUAL

400,00

R\$

101,55 R\$

TOTAL DE CONTRATO R\$

R\$

2.886.422,74

R\$
